Руководитель
регионального проекта —
Фетисов Михаил Михайлович
_____
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
718456A31622626ABCEEF57544B7629E2F629520

Владелец: Серенко Виктория Владимировна

Действителен: с 29.04.2019 по 29.07.2020

03.12.2019

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

"(Т2-11) Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	--			
Наличие некритических отклонений	--	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Сведения не представлены*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		6. План мероприятий	Сдиг сроков на 1 кв.2020 года, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г.	Предлагаемые решения: 1. Принятие НПА перенесено, срок исполнения 01.04.2020;

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК Значение: 0.0002, на дату 30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024		В работе.
1.1	КРП		Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий	15.12.2019	15.12.2019		В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя: •целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения •ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы); •план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; •виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен).	31.03.2019	31.03.2019	Мясникова Т. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сбалансированный план" Иной вид документа Департамент ПР и АПК НАО от 31.03.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.2	РРП		Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК	15.12.2019	15.12.2019	Мартынов Д. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	КРП		Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки	31.12.2021	31.12.2021		В работе. Существует риск: Сдвиг сроков на 1 кв.2020, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принятие НПА перенесено на 1 кв.2020г, срок исполнения 01.04.2020.
1.2.1	РРП		Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных	31.10.2019	01.04.2020	Мартынов Д. В.	В работе. Просрочка 153 дней. Существует риск: Сдиг сроков на 1 кв.2020 года, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принятие НПА перенесено, срок исполнения 01.04.2020.
1.2.2	РРП		Внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных	30.12.2019	01.04.2020	Мясникова Т. С.	В работе. Просрочка 93 дней. Существует риск: Сдвин сроков на 1 кв.2020г., Причина риска: В связис отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

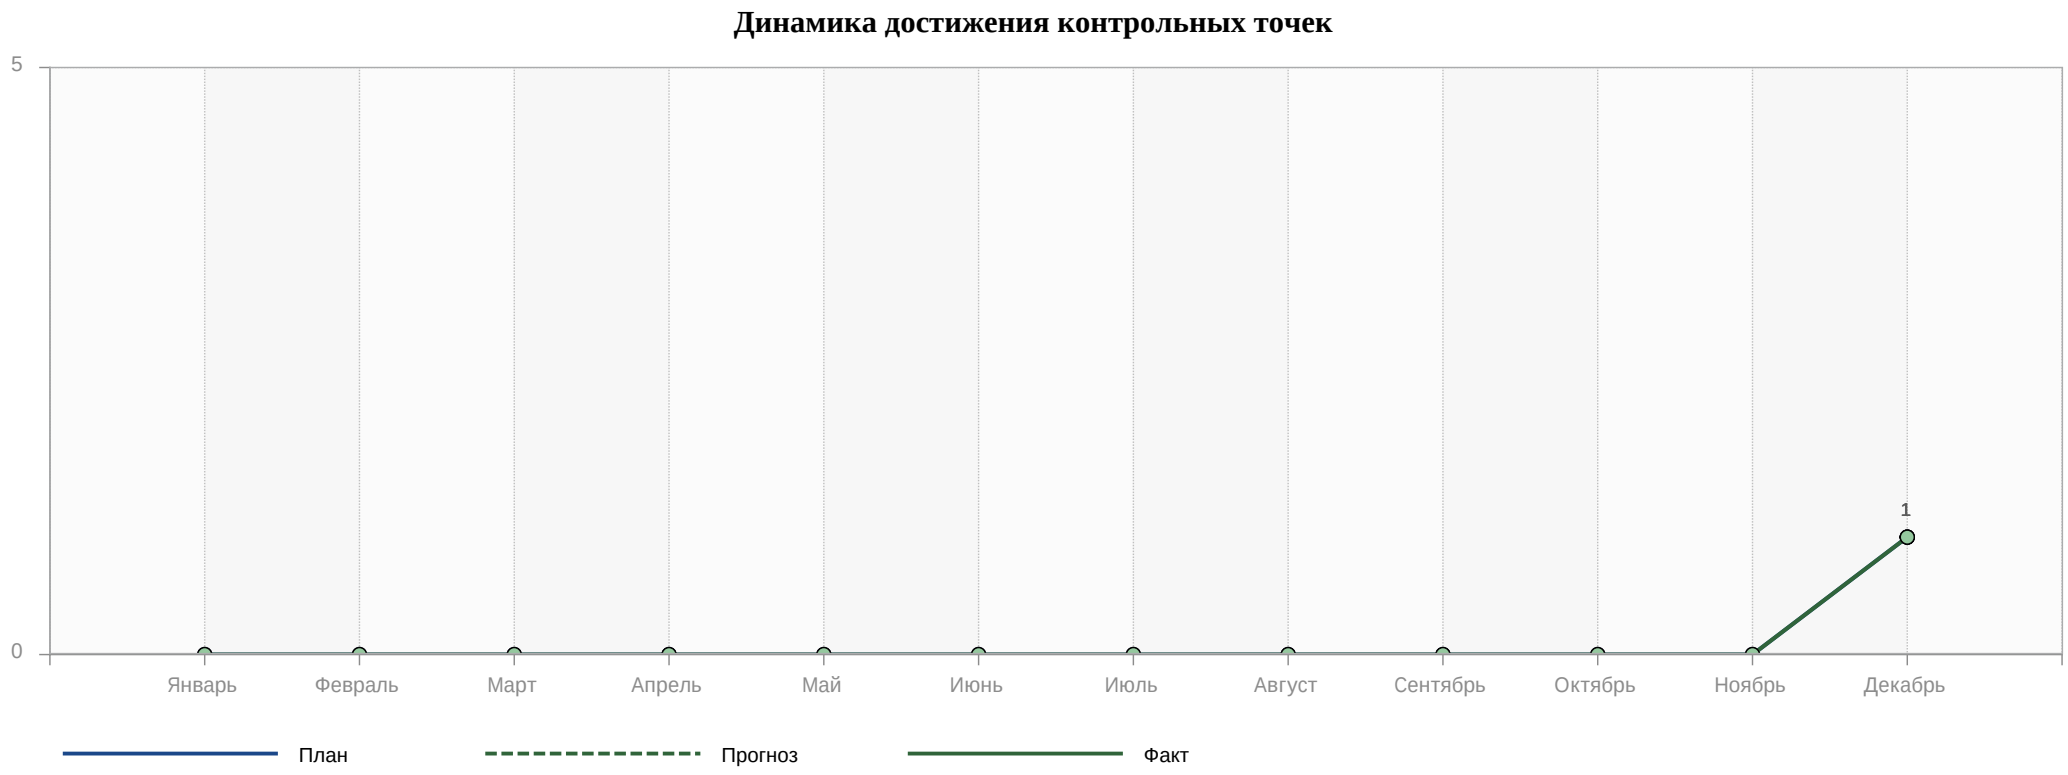

Рис. 1. *"(Т2-11) Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"*

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения
